Proyecto Refundido de la EDAR de Lagrán, T.M. Lagrán (Álava)

Promotor: URA - Agencia Vasca del agua

| Id | Nombre de tarea | Duración |
|---|---|---|
| 1 | **P.R. DE LA EDAR DE LAGRÁN** | **140 días** |
| 2 | **LABORES PREVIAS (Vallado, señalización,...)** | **4 días** |
| 3 | **DESBROCE Y TALADO** | **8 días** |
| 4 | **ACONDICIONEMIENTO CAMINO TIERRAS** | **7 días** |
| 5 | **EXCAVACIONES EDAR Y CONTENCIONES** | **16 días** |
| 6 | **SUBDRENAJE Y COLECTORES EDAR-RIO** | **6 días** |
| 7 | **TERRAPLENADO (Relleno tierras, lechos de ramaje,...)** | **8 días** |
| 8 | **OBRA CIVIL ARQUETAS DE PROCESO (Etapa 1, Etapa 2 y Pharsall)** | **10 días** |
| 9 | **COLECTORES ENTRE ARQUETAS Y BALSAS** | **7 días** |
| 10 | **CANALIZACIONES AUXILIARES (agua, electricidad y datos** | **7 días** |
| 11 | **CONFORMADO Y REFINO DE BALSAS** | **6 días** |
| 12 | **IMPERMEABILIZACIÓN DE BALSAS (Zanjas de anclaje y geosintéticos)** | **8 días** |
| 13 | **TUBERÍAS EN BALSAS, RELLENO DE GRAVAS E INSTALACIÓN ESCALERAS** | **10 días** |
| 14 | **PLANTACIONES Y LLENADO DE AGUA EN BALSAS** | **5 días** |
| 15 | **CASETA DE APEROS** | **5 días** |
| 16 | **URBANIZACIÓN (Pavimentos, cunetas, vallados, hidrosiembra,...)** | **10 días** |
| 17 | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS EN EDAR** | **6 días** |
| 18 | **INSTALACIÓN DE EQUIPOS (Reja automática, sifones, medidor ultrasónico,...)** | **6 días** |
| 19 | **ACOMETIDA ELÉCTRICA** | **92 días** |
| 20 | **ACOMETIDA AGUA** | **92 días** |
| 21 | **MEDIDAS AMBIENTALES** | **98 días** |
| 22 | **PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS** | **43 días** |
| 23 | **CONTROL DE CALIDAD** | **140 días** |
| 24 | **GESTIÓN DE RESIDUOS** | **140 días** |
| 25 | **SEGURIDAD Y SALUD** | **140 días** |

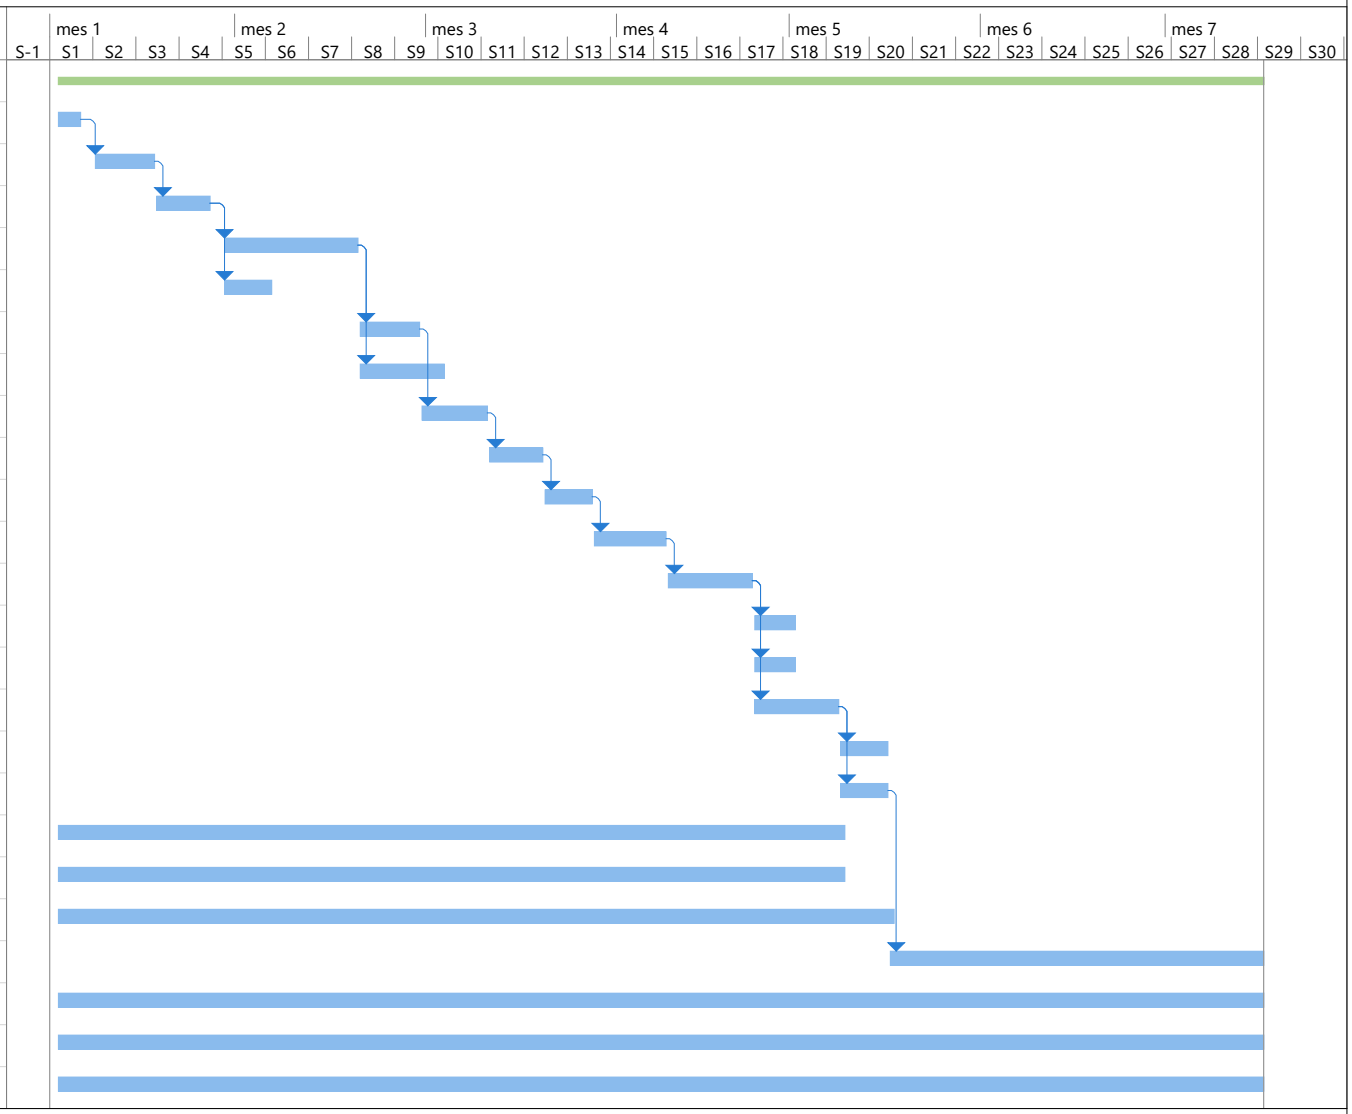


Fecha: marzo 2022

Resumen del proyecto

Tarea
