Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
0		**Nuevo almacén de recipientes móviles**	**lun 27/09/21**	**vie 09/12/22**
1		**1 Interacciones con el cliente**	**lun 11/10/21**	**vie 30/09/22**
2		**1.1 Aprobaciones de Ingeniería Conceptual**	**mar 09/11/21**	**mar 14/12/21**
8		**1.2 Aprobaciones de Ingeniería Básica**	**jue 09/12/21**	**vie 07/01/22**
12		**1.3 Adjudicaciones**	**lun 11/10/21**	**mar 24/05/22**
19		**1.4 Tiempo de obra**	**lun 23/05/22**	**vie 30/09/22**
22		2 Reunión de lanzamiento de Ingeniería	lun 18/10/21	lun 18/10/21
23		**3 Tramitaciones medioambientales**	**lun 27/09/21**	**vie 23/09/22**
24		3.1 Evaluación ambiental EIA simplificado	lun 27/09/21	vie 05/11/21
25		3.2 Memoria de modificación no sustancial	lun 27/09/21	vie 05/11/21
26		**3.3 Plan de Excavación y Seguimiento**	**lun 27/09/21**	**vie 23/09/22**
27		3.3.1 Caracterización del suelo	lun 27/09/21	vie 05/11/21
28		3.3.2 Elaboración del plan de excavación	lun 08/11/21	mar 07/12/21
29		**3.3.3 Supervisión de la excavación**	**lun 23/05/22**	**vie 09/09/22**
32		3.3.4 Informe final de la excavación	lun 12/09/22	vie 23/09/22
33		**4 Permisos y Legalizaciones Fase Inicial**	**vie 03/12/21**	**vie 28/01/22**
34		**4.1 Apertura de licencia de Obras**	**lun 10/01/22**	**vie 28/01/22**
40		**4.2 Apertura Licencia de Actividad**	**vie 03/12/21**	**vie 24/12/21**
44		**5 Permisos y Legalizaciones Fase Final**	**vie 09/09/22**	**vie 28/10/22**
45		**5.1 Cierre de Licencia de Obras**	**jue 22/09/22**	**lun 24/10/22**
50		5.2 Cierre de Licencia de Actividad	mar 25/10/22	vie 28/10/22
51		**5.3 Legalización BT**	**vie 09/09/22**	**lun 19/09/22**
55		**5.4 Legalización APQ - PCI**	**mar 27/09/22**	**lun 10/10/22**
59		**6 Ingeniería conceptual**	**mar 26/10/21**	**jue 25/11/21**
60		6.1 Planteamiento APQ	mar 26/10/21	mar 02/11/21
61		6.2 Planteamiento PCI	mié 03/11/21	lun 08/11/21
62		6.3 Flujos de materias	mié 10/11/21	jue 11/11/21
63		6.4 Implantación general	lun 15/11/21	jue 18/11/21
64		6.5 Entrega de Ingeniería conceptual	lun 22/11/21	jue 25/11/21
65		**7 Ingeniería Básica**	**vie 03/12/21**	**vie 07/01/22**
66		7.1 IB Nave Almacén	vie 03/12/21	mié 08/12/21
67		7.2 IB Urbanización	jue 09/12/21	vie 10/12/21
68		7.3 IB Obra Civil	lun 13/12/21	mar 28/12/21
69		7.4 IB Instalaciones	mié 29/12/21	lun 03/01/22
70		7.5 IB Documento de proyecto	mar 04/01/22	vie 07/01/22
71		**8 Especificaciones técnicas equipos principales**	**lun 10/01/22**	**mié 19/01/22**
75		**9 Ingeniería de Detalle**	**lun 10/01/22**	**mar 08/03/22**
81		**10 Especificaciones técnicas de instalación**	**mié 09/03/22**	**mié 30/03/22**
86		**11 Apoyo en la Gestión de Compra (GC)**	**jue 13/01/22**	**mar 26/04/22**
111		**12 Supevisión técnica**	**lun 23/05/22**	**vie 30/09/22**
132		**13 Documentación As Built**	**lun 12/09/22**	**jue 06/10/22**
136		**14 Nuevo almacén de recipientes móviles (GPyC)**	**lun 27/09/21**	**vie 09/12/22**

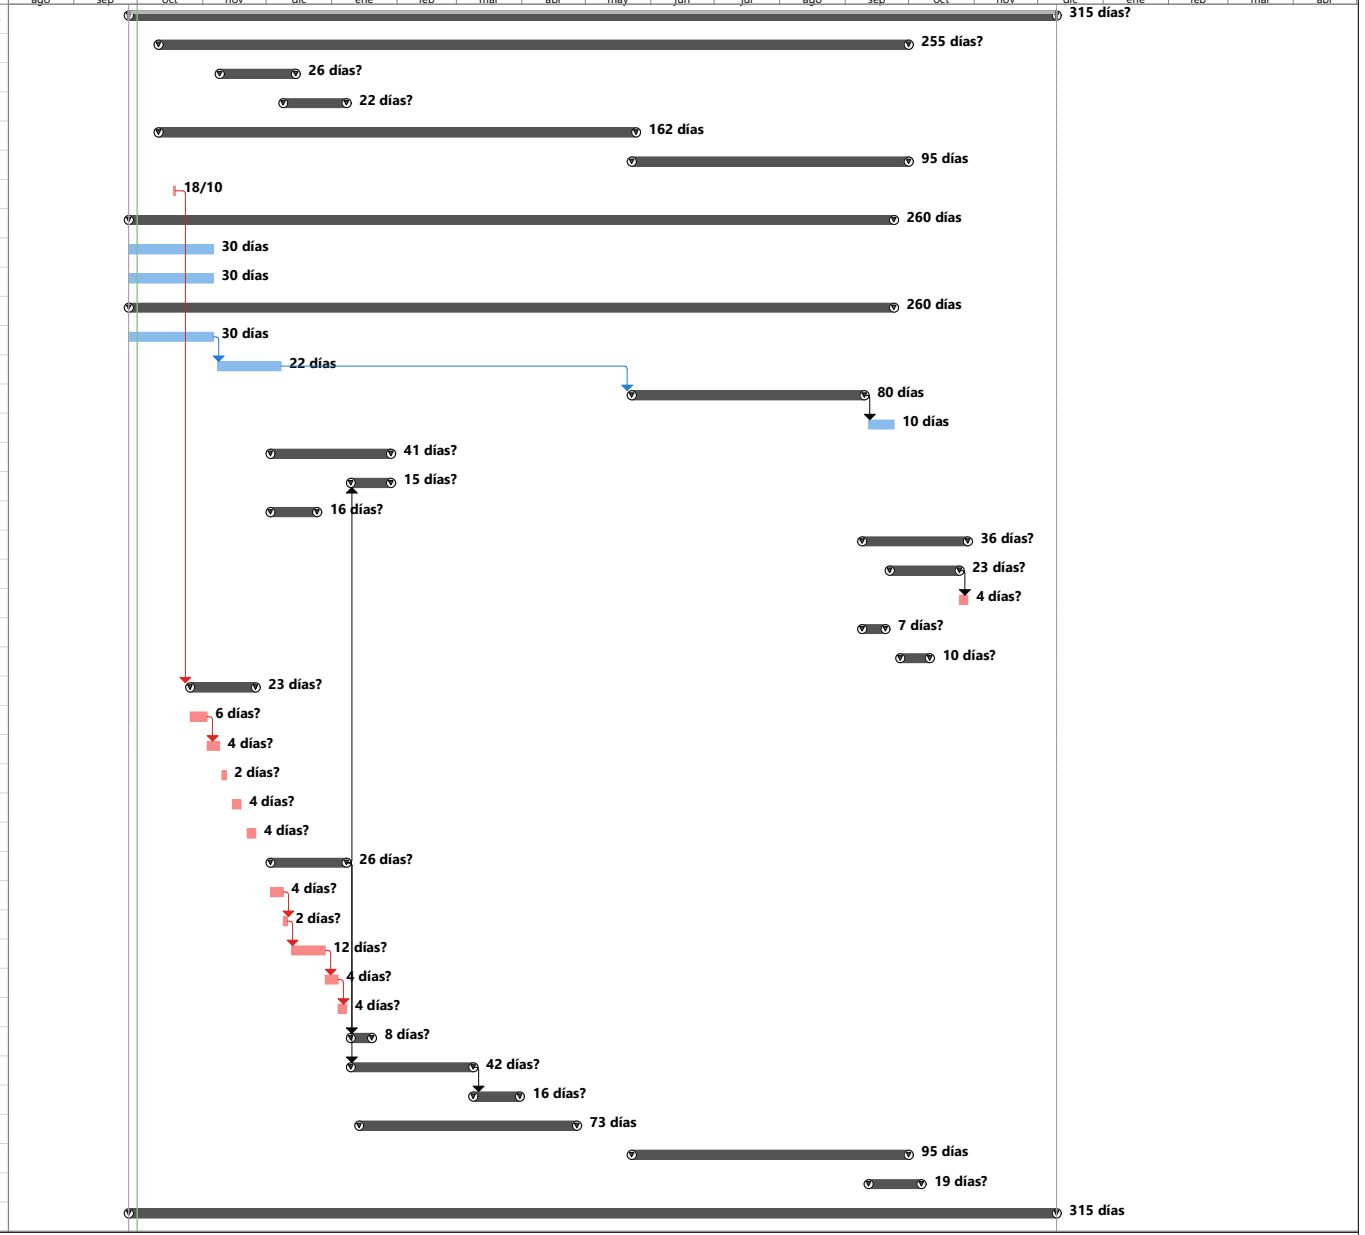

Proyecto: Nuevo almacén de re
Fecha: vie 01/10/21

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			
