



# SISTEMA DE GESTIÓN DE JUSTICIA AVANTIUS

Proyecto de Implantación en Euskadi


# Índice

1. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE AVANTIUS
2. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN Y PLANIFICACIÓN
3. VOLUMETRIAS IMPLANTACIÓN DE AVANTIUS EN EUSKADI



## Características Diferenciales de Avantius

Gestión integral de expedientes judiciales permitiendo que los distintos órganos judiciales, fiscales o cualquier otro profesional (interno o externo) puedan intervenir en un proceso, con la debida seguridad, dentro de un Expediente Judicial Electrónico Único

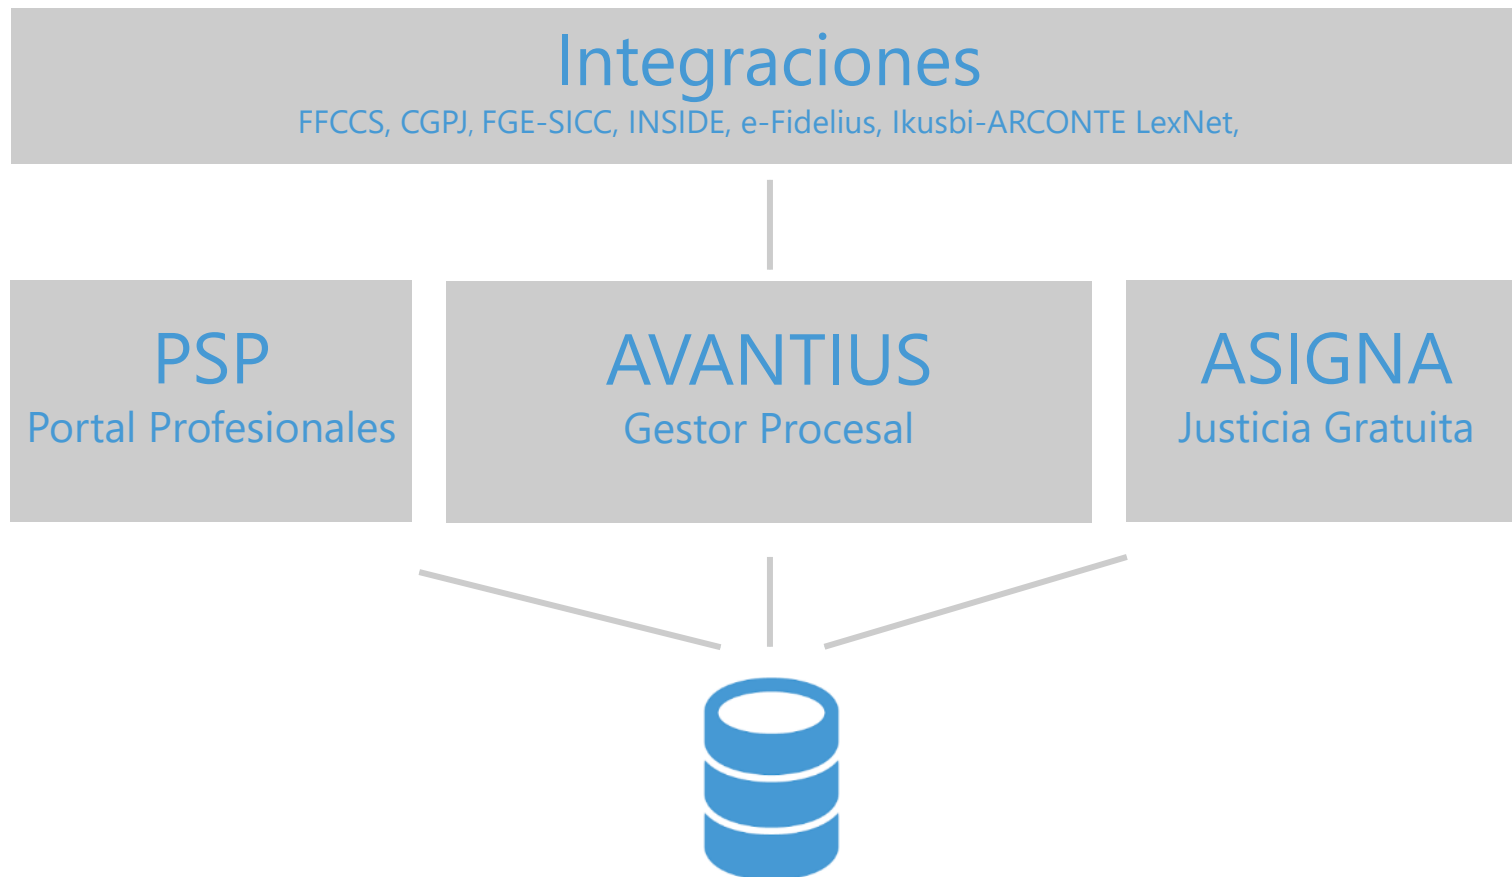


- ✓ **Justicia más accesible**, pudiendo acceder al expediente judicial desde cualquier puesto de trabajo
- ✓ **Justicia más transparente**, al facilitarse el acceso (en tiempo real) al estado de un expediente judicial
- ✓ **Justicia más ágil**, reduciendo el coste del intercambio de información
- ✓ **Justicia más sostenible**, tanto ecológica como económicamente ahorrando papel y costes
- ✓ **Justicia más eficiente**, pudiendo asignar mejor los diferentes recursos






## CERTIFICACIÓN CGPJ



Estás en: [Compendio de Derecho Judicial](#) > [Instrucciones](#)

jueves, 22 de noviembre de 2018


Instrucción 1/2018, de 22 de noviembre, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativa a la obligatoriedad para jueces/zas y magistrados/as del empleo de medios informáticos a que se refiere el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

-  AVANTIUS es, a día de hoy, el único Sistema de Gestión Procesal certificado (Abril 2019) por el Consejo General del Poder Judicial como Sistema de Gestión Procesal válido y de uso obligatorio para Jueces para el trabajo con el Expediente Judicial Electrónico (Instrucción 1/2018 CGPJ)

## MAPA DE IMPLANTACIÓN Y FEEDBACK DE USUARIO 2021

Avantius está implantado en Navarra (2004), Cantabria (2011), Andorra (2014), Aragón (2018) y Euskadi (2023), dando servicio a más de 6.500 usuarios de la Administración de Justicia y a más de 70.000 profesionales y cooperadores

Avantius es el Sistema de Gestión de Expediente Judicial Electrónico desplegado en más CCAA con competencias de España, convirtiéndose en el vehículo común de la modernización de justicia en el Norte de España

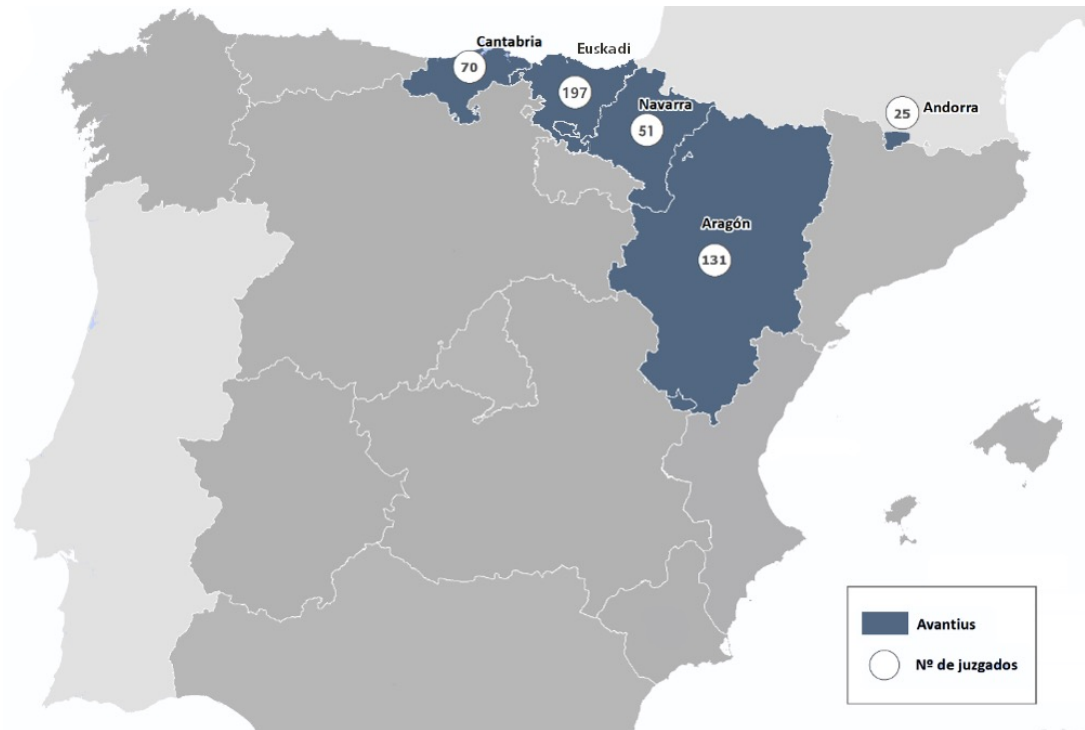



## Metodología de implantación y planificación

## OBJETIVO:

- Implantar el Expediente Judicial Electrónico mediante el Sistema de Gestión de Justicia *Avantius* en la Administración de Justicia de Euskadi sobre una arquitectura de nueva creación, sustituyendo a los sistemas actuales de gestión procesal de la Administración de Justicia y sirviendo de base para futuras ampliaciones

## ALCANCE:

- Implantación de las siguientes aplicaciones:
  - AVANTIUS: sistema de gestión procesal [incluye Justicia Gratuita]
  - PSP: Portal de Servicios para el Profesional [defensores, representantes legales, intervinientes especiales y personas físicas/jurídicas]
- El proyecto se divide en tres fases:
  - FASE A: Preparación del despliegue
  - FASE B: Despliegue
  - FASE C: Seguimiento y monitorización
- Dentro de la Fase A, se incluye el desarrollo de las “Adaptaciones específicas”

## ASPECTOS CLAVE PARA LOGRAR EL ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN

### ↳ PERSONALIZACION

- Configuración y parametrización Básica de las aplicaciones (reutilización de plantillas JBAT en AVANTIUS)

### ↳ SISTEMAS

- Instalación en el entorno de PRE-producción y PROducción [Aplicación web]
  - Ahorro de costes en MTO y Despliegue
  - Servidor Centralizado
  - Reducción de múltiples Servidores (no web) a 1 servidor de base de datos con AVANTIUS

### ↳ FORMACION

- Formación Funcional y Técnica a Equipos de Gobierno Vasco y directamente a Usuarios

### ↳ GESTION DEL CAMBIO

- Compromiso de Admon. Justicia, TSJ y Fiscalía de la CCAA
- Gestión del cambio con usuarios y Acompañamiento presencial al despliegue

### ↳ MIGRACION

- Proyecto de Migración de datos y documentos de los expedientes de JBAT a AVANTIUS
  - Normalización de datos
  - Migración masiva / selectiva

## CONTENIDO POR FASE Y PLANIFICACION




**Gestión y seguimiento de Proyecto**

## PROYECTO REALIZADO SIN DESVIACION DE TIEMPO, ALCANCE y COSTE

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	tri 1, 2022		tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023				
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene			
▲ FASE A: PREPARACION DEL DESPLIEGUE	244 días	lun 03/01/22	lun 19/12/22	100%																100%
▲ A1: PREPARACIÓN AVANTIUS	244 días	lun 03/01/22	lun 19/12/22	100%																100%
▷ I. Configuración	140 días	lun 14/02/22	vie 26/08/22	100%																100%
▷ II. Adaptación Específica e Instalación de AVANTIUS	244 días	lun 03/01/22	lun 19/12/22	100%																100%
▷ III. Preparación del material de formación	75 días	mar 15/03/22	lun 27/06/22	100%																100%
▷ IV. Definición y acuerdo del plan de Despliegue de /	45 días	lun 02/05/22	vie 01/07/22	100%																100%
▷ V. Preparación del equipo "oficina volante funcional" y formalización de su calendario	15 días	lun 13/06/22	vie 01/07/22	100%																100%
▷ A2: PREPARACIÓN INFRAESTRUCTURA	120 días	lun 03/01/22	vie 17/06/22	100%																100%
▷ A3: MIGRACIÓN	130 días	lun 24/01/22	vie 22/07/22	100%																100%
▲ A4: PREPARACIÓN PSP - PORTAL DE SERVICIOS PARA EL PROFESIONAL	208 días	mar 22/02/22	lun 19/12/22	100%																100%
▷ I. Protocolo General	65 días	vie 08/04/22	jue 07/07/22	100%																100%
▷ II. Configuración del PSP	40 días	lun 18/04/22	vie 10/06/22	100%																100%
▷ III. Instalación del PSP	208 días	mar 22/02/22	lun 19/12/22	100%																100%
▲ A5: PREPARACIÓN CAU (Centro de Atención al Usuario)	95 días	lun 02/05/22	vie 09/09/22	100%																100%
▷ I. Funciones y procesos del Soporte	20 días	lun 02/05/22	vie 27/05/22	100%																100%
▷ II. Herramienta de Helpdesk	20 días	lun 30/05/22	vie 24/06/22	100%																100%
▷ III. Formación equipos de soporte	5 días	lun 05/09/22	vie 09/09/22	100%																100%

## PROYECTO REALIZADO SIN DESVIACION DE TIEMPO, ALCANCE y COSTE

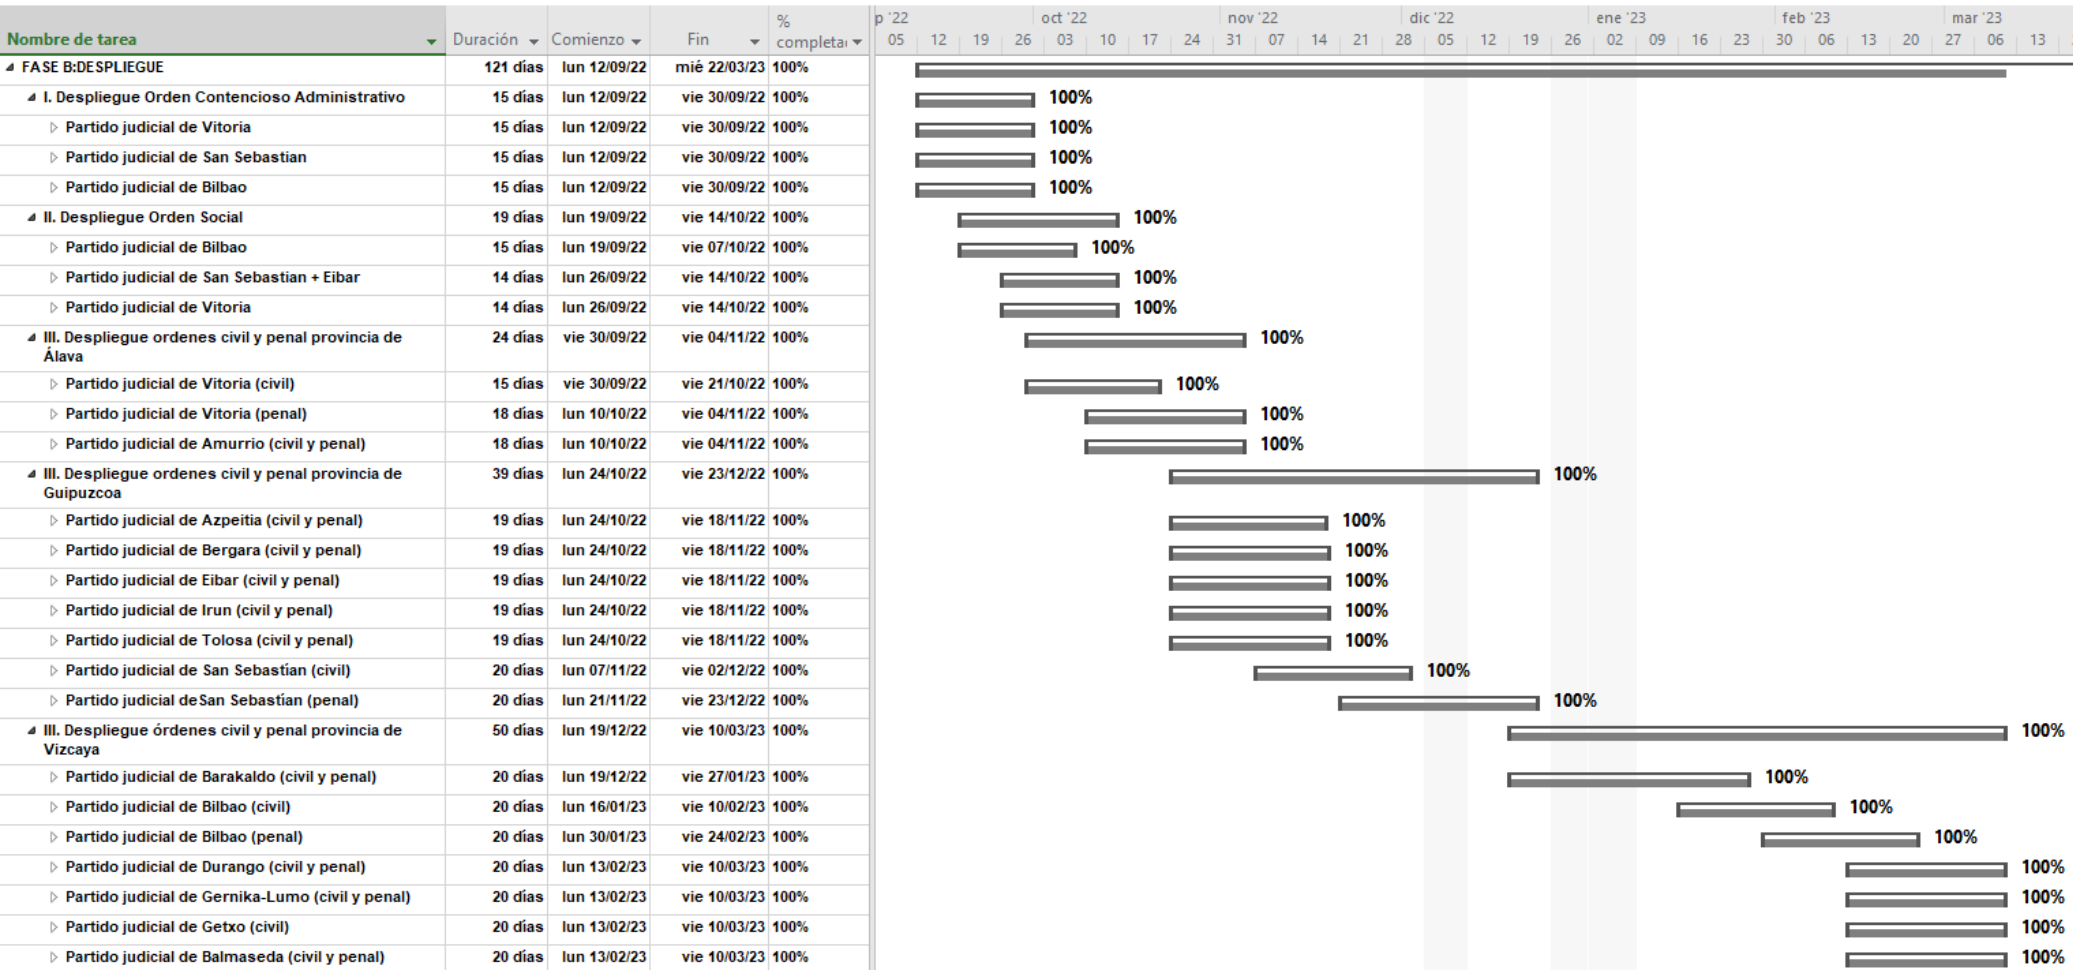

## REUNIONES DEL COMITÉ DE IMPLANTACIÓN

El Comité de Implantación es el máximo órgano de gobierno del proyecto, con capacidad para representar, tanto a la Administración de Justicia, Fiscalía, al Gobierno del País Vasco y EJIE, como a Tracasa Instrumental, en el marco de colaboración de este Proyecto

### Participantes

#### Administración de Justicia del País Vasco

Presidente TSJ  
 Decano de los Juzgados de Bilbao  
 Decana de los Juzgados de Vitoria-Gasteiz  
 Magistrado de lo Penal de Donostia-San Sebastián  
 Fiscal Superior del País Vasco  
 Fiscalía Provincial de Álava  
 Fiscalía Provincial de Bizkaia  
 Fiscalía Provincial de Gipuzkoa,  
 Secretaria de Gobierno TSJ  
 Secretaria Coord. Prov. Álava  
 Secretaria Coord. Prov. Gipuzkoa  
 Secretaria Coord. Prov. Bizkaia  
 Director Instituto Vasco de Medicina Legal

#### Dir. de Justicia Digital e infraestructuras del Gobierno Vasco

Director  
 Responsable del Proyecto EJE  
 Técnico del SIJ  
 Técnico Servicio de Proyectos

#### EJIE

Jefe de proyecto  
 Técnico de proyecto

#### Tracasa Instrumental

Jefe de proyecto  
 Responsable Funcional  
 Gestor de proyecto

### Periodicidad

Mensual

### Documentación

Actas de reuniones de implantación  
 Informes de avance del proyecto  
 Otro tipo de documentación necesaria para agilizar la toma de decisiones



## Volumetrías Implantación AVANTIUS en Euskadi



**VOLUMETRIAS DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE AVANTIUS EN EUSKADI**

**Actualización semanal de Avantius  
con un total de 196 mejoras**

**Han sido atendidas 9.000  
incidencias**

**2 semanas de in situ en 200  
órganos judiciales con picos  
de más de 50 técnicos en sede  
judicial**

**Integrar, formar y guiar a  
casi 500 Administraciones  
públicas con sus 7.000  
usuarios**



**Formaciones en streaming  
y acceso directo a PSP para  
los 175.996 profesionales  
censados**

**176 nuevas funcionalidades  
desarrolladas en 7 meses de la  
FASE A**

**12 millones de expedientes  
con 100 millones de  
documentos y 21 millones de  
personas migrados**

**280 cursos de formación  
presencial 321 Jueces, 118  
Fiscales, 330 LAJ y 2.741  
oficinas**



[www.itracasa.es](http://www.itracasa.es)



[info@itracasa.es](mailto:info@itracasa.es)

